



# verslag

---

Verslag van	Kwartetoverleg Everinge-, Van Hattum-, Ellewoutdijkpolder + aansluitend deel Baarland (Zuidgors)
Datum bespreking	17 september 2009
Deelnemers	Klaas Kaslander Peter Meininger Raymond Derksen Silvester Vermunt Michel Braad
Afschrift aan	Roy van der Voort

---

## Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

P/a Waterschap Zeeuwse  
Eilanden  
Kanaalweg 1  
Middelburg  
P/a Postadres: Postbus 1000  
4330 ZW Middelburg  
T (0118) 62 13 70  
www.zeeweringen.nl

## Contactpersoon

-

T -

## Datum

17 september 2009

## Nummer

PZDB-V-09082

## Bijlage(n)

ja

Tijdens het kwartetoverleg is het stuk: Voorlopige mitigerende maatregelen Dijktraject: Everinge-, Van Hattum-, Ellewoutdijkpolder + aansluitend deel Baarland besproken. Het document is als bijlage bijgevoegd en aangepast op de zaken zoals besproken tijdens het overleg. De aanpassingen zijn hieronder kort weergegeven:

- De fasering rondom de broedkolonie is dp 439 – dp 446, dit wordt smaller dp 440 – dp 446.
- De mitigerende maatregelen worden verder doorgenomen en akkoord bevonden, geen wijzigingen.



013815 2009 PZDB-V-09082

dam Verslag kwartet overleg 17 september 2009 Eve



## **Bijlage: Voorlopige mitigerende maatregelen Dijktraject Everinge-, Van Hattum-, Ellewoutsdijkpolder + aansluitend deel Baarland**

**Rijkswaterstaat Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen

**Datum**  
17 september 2009

**Nummer**  
PZDB-V-09082

### **Standaard Mitigerende maatregelen**

- Vóór 15 maart zal de vegetatie op het buitentalud en kruin zeer kort gemaaid worden, tenzij in de locatiespecifieke maatregelen anders is aangegeven.
- De breedte van de werkstrook bedraagt maximaal 15 meter, gerekend vanuit de nieuwe waterbouwkundige teen van de dijk. Voor zover mogelijk zal een smallere werkstrook aangehouden worden.
- Indien het voorland uit slik bestaat, worden vrijkomende grond en stenen ter plaatse van de kreukelberm verwerkt en niet over de gehele werkstrook. De stenen en grond worden zo egaal mogelijk over grote dijk lengte verdeeld, waardoor de ophoging zo min mogelijk wordt. Perkoenpalen en overige vrijkomend materiaal worden verwijderd en afgevoerd.
- Het voorland (slik of schor) in de werkstrook wordt aansluitend op de werkzaamheden op de oorspronkelijke hoogte teruggebracht, tenzij in de locatiespecifieke maatregelen anders is aangegeven. Voor slik geldt dit voor de werkstrook buiten de kreukelberm, voor schor echter over de gehele breedte van de werkstrook. Eventuele kreekjes die binnen de werkstrook (en buiten de kreukelberm) zijn gelegen dienen vooraf geregistreerd, en na afloop, hersteld te worden.
- Er vindt op het slik of schor geen opslag van materiaal en/of grond plaats buiten de werkstrook, ook niet in aangrenzende dijktrajecten.
- Er vindt geen betreding van het voorland buiten de werkstrook plaats, niet door personen noch met materieel, tenzij in de locatiespecifieke maatregelen anders is aangegeven.

### **Broedvogels (locatiespecifieke maatregelen)**

#### *Mitigerende maatregelen bruine kiekendief*

- De werkzaamheden langs het Zuidgors tussen dp 446 - dp 467 starten voor 1 april, voordat de bruine kiekendief tot broeden komt.
- De vegetatie in de werkstrook (maximaal 15 meter) vanaf 15 maart platrijden, zolang hier niet gewerkt wordt, zodat hier geen vogels tot broeden komen.

#### *Mitigerende maatregel zwartkopmeeuw*

- Werkzaamheden ter plaatse van de broedkolonie buiten de broedperiode (1 maart - 1 juli) uitvoeren.



- De standaard mitigerende maatregel: vóór 15 maart de vegetatie op het buitentalud en kruin kort maaien, gaat niet op voor dit traject (dp 440 en dp 446). Dit om verstoring van de broedkolonie te voorkomen.
- Langs dit traject mag op het buitentalud en de kruin geen werkverkeer op en neer rijden, om bijvoorbeeld andere trajectdelen te bereiken.
- Voor 1 juli brengt de trajectecoloog een bezoek aan het dijktraject tussen dp 439 en dp 446 om broedgevallen in de werkstrook en op de dijk uit te sluiten.
- Indien broedvogels aanwezig zijn, mogen de werkzaamheden pas aanvangen vanaf 1 augustus of wanneer de broedgevallen niet meer aanwezig zijn. De trajectecoloog zal dit monitoren.

**Rijkswaterstaat Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen

**Datum**  
17 september 2009

**Nummer**  
PZDB-V-09082

## Niet - Broedvogels

Voorlopig worden voor de afzonderlijke kwalificerende niet-broedvogels geen locatiespecifieke maatregelen voorgesteld. Het voorkomen van verstoring van deze vogels op de HVP's is helaas niet mogelijk. Met de voorgesteld fasering worden de HVP's en broedkolonie zoveel mogelijk ontzien waardoor de effecten zo beperkt mogelijk worden gehouden.

Voorstel voor fasering:


Periode	Dijkpaalnummers:		
	467 - 446 Zuidgors	446 - 440 Broedkolonie	440 - 427 Baarland
maart			
april			
mei			
juni			
juli			
augustus			
september			
oktober			



werkzaamheden toegestaan



werkzaamheden niet-toegestaan

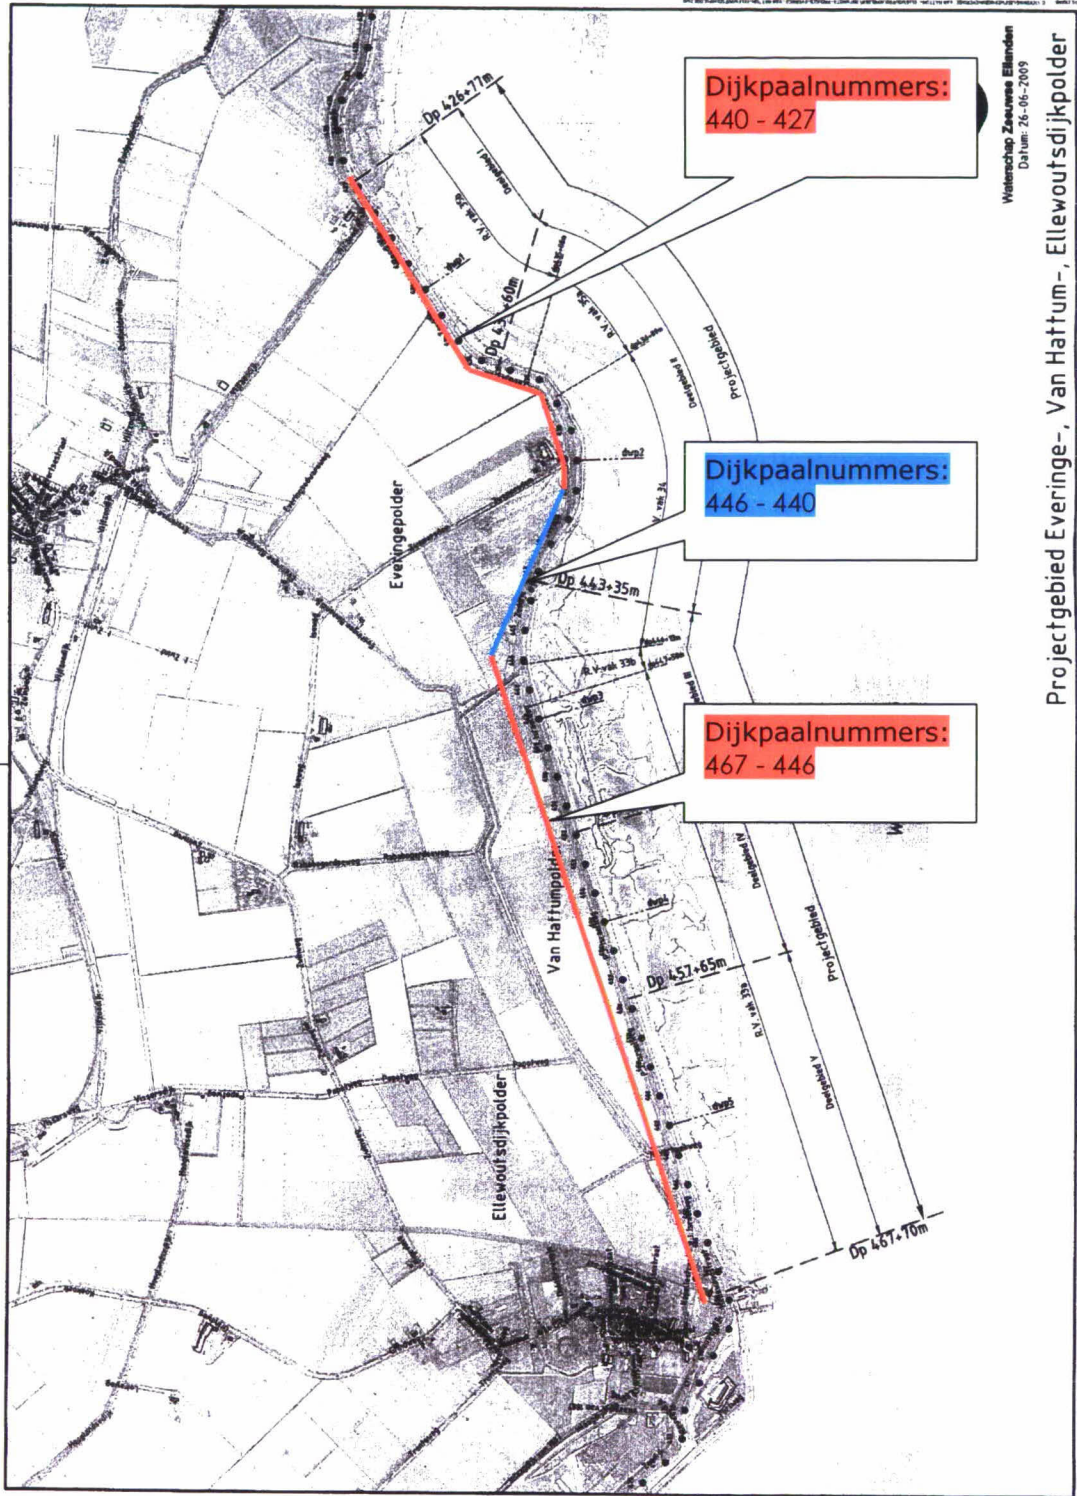

Topografische ondergrond: I) Topografische Dienst Kadaster, Topografische ondergrond; II) Regionaal Samenwerkingsverband Zeeland (RSB)
