

# Memo



Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat  
Directie Zeeland

Aan  
Alle medewerkers Projectbureau  
Zeeweringen

Van  
[Redacted]  
Datum  
27 maart 2000  
Onderwerp  
planning voorbereiding dijkvak  
Biezelingse Ham

Doorkiesnummer  
[Redacted] 9  
Bijlage(n)  
1  
Kenmerk  
PZST-M-00055 pl

Beste collega's,

Hierbij ontvangen jullie de planning van het dijkvak "Biezelingse Ham" die dit jaar in voorbereiding wordt genomen. Deze is in het projectbureau-overleg van 16-3 jl. vastgesteld. De planning is gericht op start uitvoering in 2001.

Ten behoeve van de bewaking van de voortgang zal maandelijks een standlijn worden bijgehouden.

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature block]

Projectbureau Zeeweringen  
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes  
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,  
Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70  
Telefax (0113) 21 61 24  
[Redacted]

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.  
Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.



005195 2000 PZST-M-00055 pl


ck gPlanningen voorbereiding dijkvak Biezelingsche Ha

# VOORBEREIDING

## Detailplanning "Biezelingse Ham"

## Zeeuwse Eilanden

ID	Task Name	Notes	Duration	Start	Finish	Qtr 1, 2000			Qtr 2, 2000			Qtr 3, 2000			Qtr 4, 2000			Qtr 1, 2001			
						Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
1	Voorbereiding Dijkvakken		300d	3-01-00	28-03-01																
2	Ontvangst inventarisatie- en toetsgegevens	PIET	1d	3-01-00	3-01-00																
3	Kwaliteitscheck inventarisatie- en toetsgegevens	DWW	10w	4-01-00	13-03-00																
4	Beoordelen inventarisatie- en toetsgegevens	ERIK	1,8w	1-03-00	13-03-00																
5	Besluit geavanceerd toetsen	PBZ	2w	14-03-00	27-03-00																
6	Geavanceerd toetsen (t/m fase 1)	DWW	3w	28-03-00	17-04-00																
7	Bespreken resultaten geavanceerd toetsen	WG KENNIS	3w	18-04-00	8-05-00																
8	Opzetten varianten (incl. groene dijk / kleidijk)	ERIK	12w	15-03-00	6-06-00																
9	Notitie keuze variant (voorontwerpdocument) bespreken WS + advies	ERIK	4w	7-06-00	4-07-00																
10	Keuze variant bespreken PBZ	PBZ	1w	5-07-00	11-07-00																
11	Uitwerken gekozen variant	ERIK	2w	5-07-00	18-07-00																
12	Opstellen ontwerpnota	KEES	4w	5-07-00	1-09-00																
13	Beoordelen nota Toetsgroep	YVO	2w	4-09-00	15-09-00																
14	Evt. verwerken commentaar Toetsgroep op nota	KEES	2w	18-09-00	29-09-00																
15	Beoordelen nota Projectbureau	PBZ	2w	2-10-00	13-10-00																
16	Opstellen ontwerpplan	JAN-WILLEM	3w	4-09-00	22-09-00																
17	Evt. verwerken commentaar Toetsgroep in ontwerpplan	JAN-WILLEM	1w	25-09-00	29-09-00																
18	Opsturen ontwerpnota- en plan naar A.O.	JAN-WILLEM	1d	16-10-00	16-10-00																
19	Ontwerpnota- en plan in A.O.	JAN-WILLEM	1d	24-10-00	24-10-00																
20	Evt. aanpassen ontwerpnota n.a.v. commentaar A.O.	KEES	1w	25-10-00	31-10-00																
21	Evt. aanpassen ontwerpplan n.a.v. commentaar A.O.	JAN-WILLEM	1w	25-10-00	31-10-00																
22	WWK-procedure	JAN-WILLEM	94d	15-11-00	26-03-01																
23	Vaststellen ontwerpplan door Dagelijks Bestuur		10d	15-11-00	28-11-00																
24	Publicatie ter inzage-legging		1d	29-11-00	29-11-00																
25	Inspraakprocedure Waterschap, ter visielegging		4w	30-11-00	27-12-00																
26	Hoorzitting (eventueel)		1d	11-01-01	11-01-01																
27	Verwerken reacties (Waterschap + projectbureau)		10d	12-01-01	25-01-01																
28	Vaststellen ontwerpplan ddor Waterschap		15d	26-01-01	15-02-01																
29	Goedkeuringsprocedure GS (max. 12 weken)		4w	16-02-01	15-03-01																
30	Melding goedkeuring aan DB Waterschap		1d	16-03-01	16-03-01																
31	Publicatie goedkeuringsbesluit door Waterschap		1d	26-03-01	26-03-01																
32	Opstellen bestek + tekeningen (concept)	LEO	8w	19-07-00	13-10-00																
33	Evt. aanpassen bestek n.a.v. commentaar toetsgroep en A.O. op nota	LEO	2w	1-11-00	14-11-00																
34	Opsturen bestek naar CX	LEO	1d	15-12-00	15-12-00																
35	Bestek in behandeling bij CX + toetsgroep + intern PBZ	LEO	8w	18-12-00	9-02-01																
36	Aanbesteding	LEO	1d	14-03-01	14-03-01																
37	Gunning	LEO	1d	28-03-01	28-03-01																

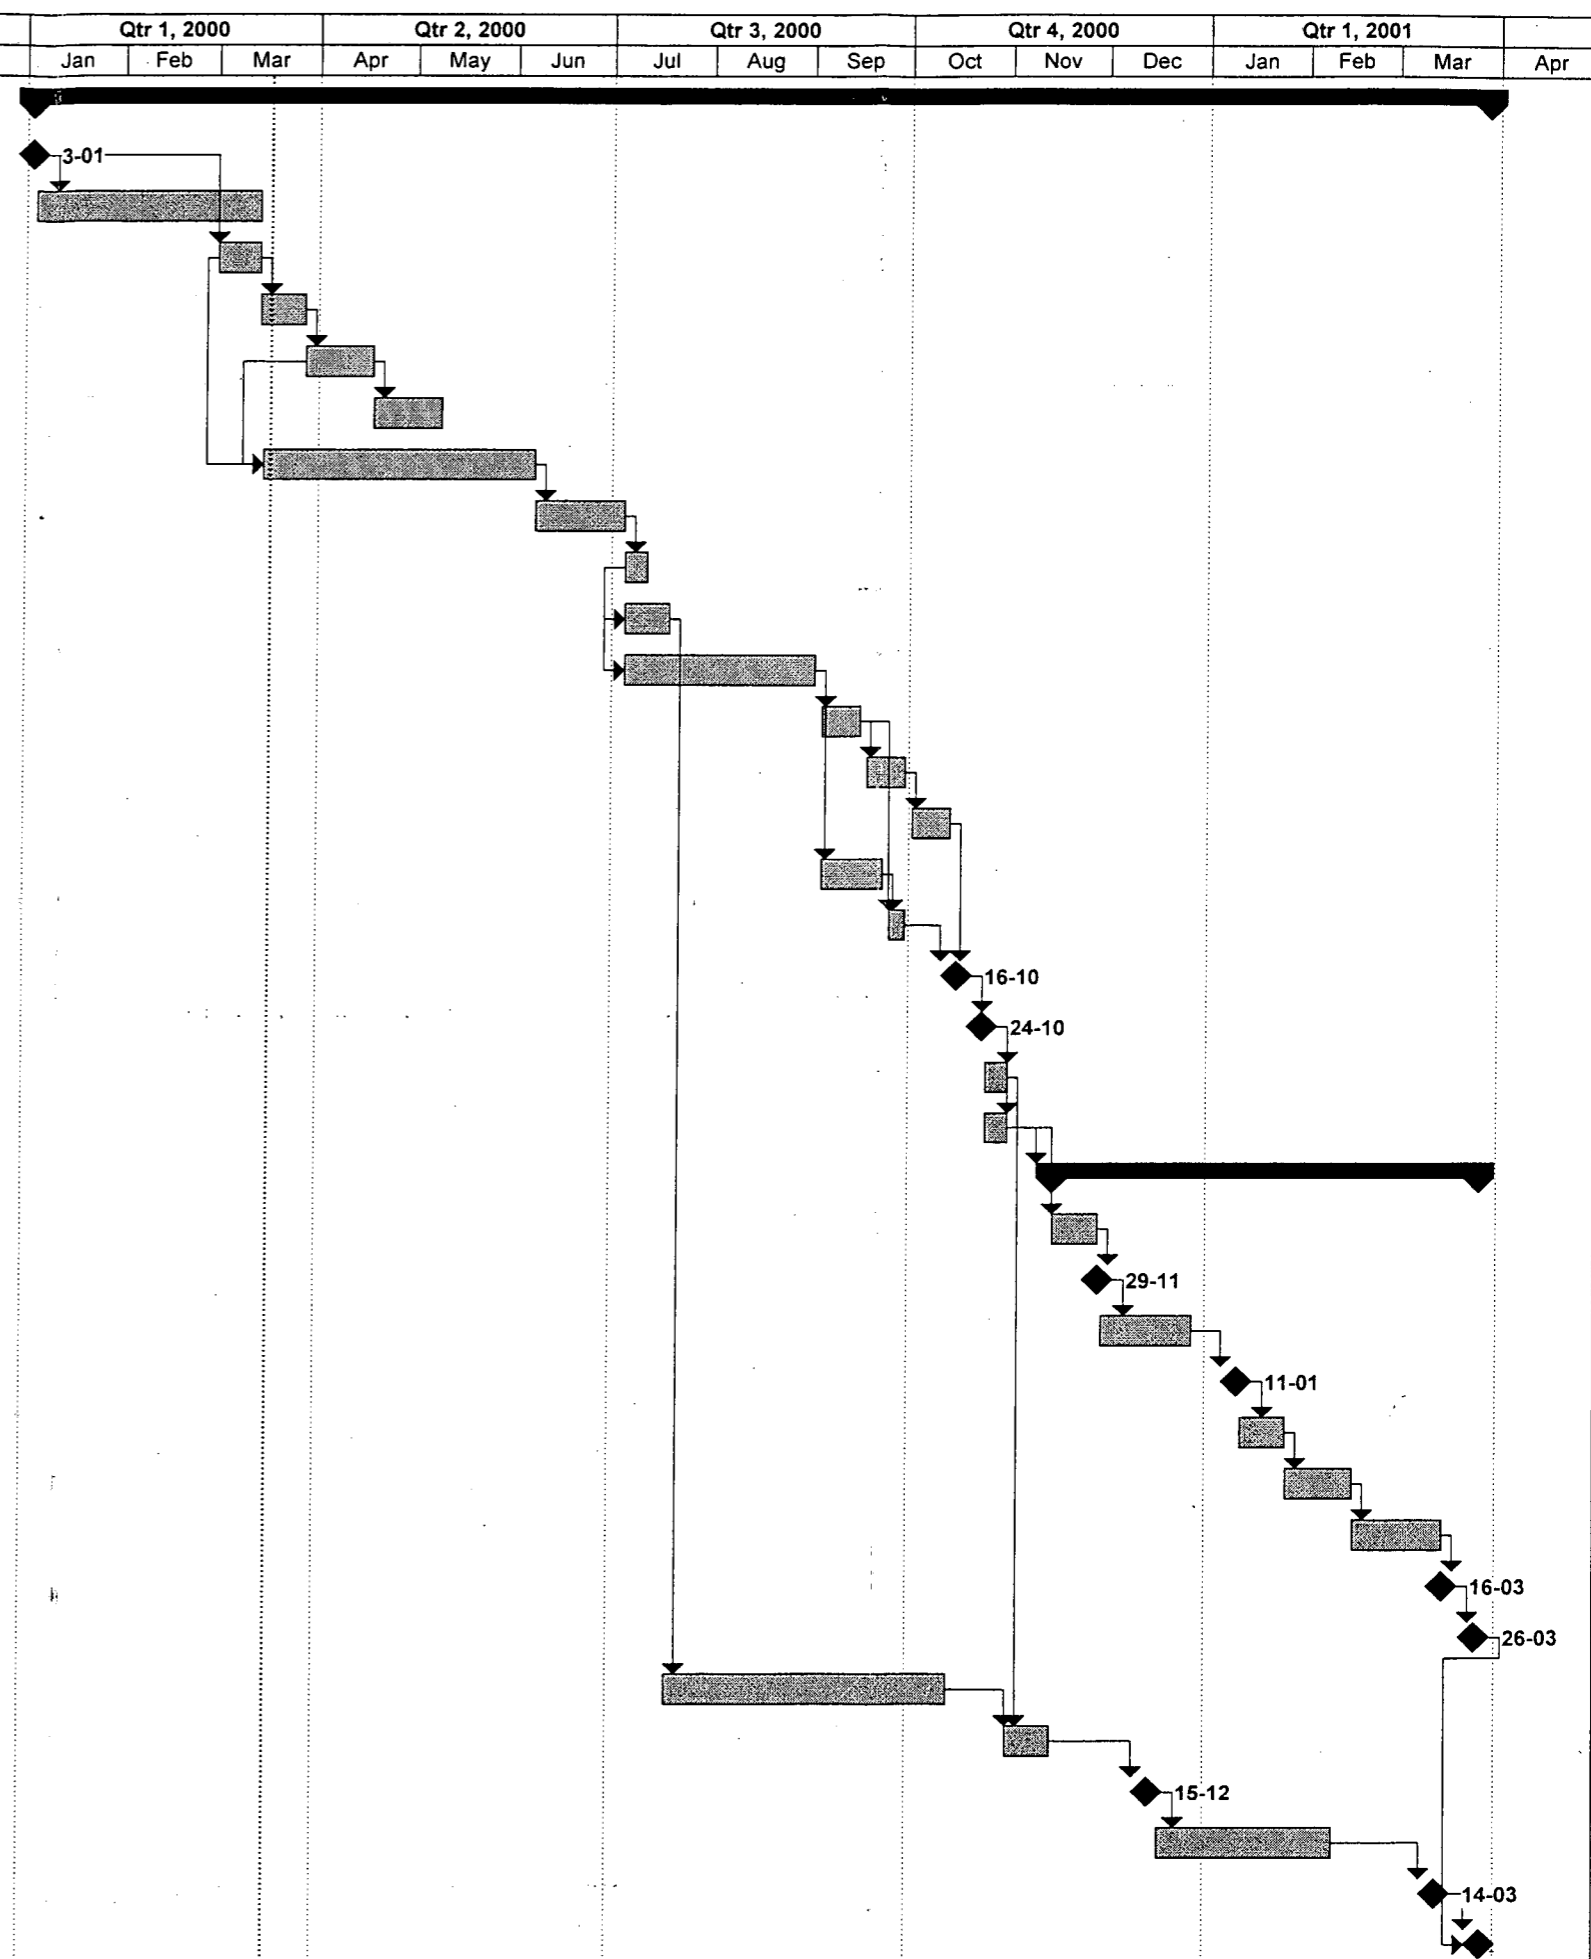

**STATUS: VASTGESTELD 16-3-2000**

Paraaf P.T.:

Paraaf P.M.:
