

Memo

PZST-M-00149PL



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

Aan
Leden PB, C. Dorst, R. den Hoed,
M. Elzinga

Van
Rogier Havermans
Datum
14 september 2000
Onderwerp
Planningen Paviljoenpolder /
Waarde-Westveerpolder

Doorkiesnummer
0113-241359
Bijlage(n)
2 stuks
Kenmerk
PZST-M-00149pl

Beste collega's,

Gelet op de voortgang van de diverse werkzaamheden van bovengenoemde dijkvakken en de noodzaak om tijdig (voor 1 april 2001) te kunnen aanbesteden en gunnen, is besloten de planningen Paviljoenpolder en Waarde-Westveerpolder enigszins aan te passen.

Bijgaand treffen jullie deze gewijzigde planningen aan. De wijzigingen zijn doorgevoerd vanaf "opstellen ontwerpnota" en werken verder door tot en met aanbesteding en gunning. Ik verzoek jullie de "oude" versies te vervangen door bijgevoegde, vigerende, planningen.

De planningen van overige dijkvakken in voorbereiding kunnen overigens gehandhaafd blijven.

Met vriendelijke groet,



Henk van den Bosch

Projectbureau Zeeweringen
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,
Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70
Telefax (0113) 21 61 24
X 400 r.havermans@dzl.rws.minvenw.nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.
Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.




005288 2000 PZST-M-00149 pl

Gewijzigde planningen Paviljoenpolder/ Waarde- V

VOORBEREIDING

Detailplanning Paviljoenpolder Zeeuwse Eilanden


ID	Task Name	Notes	Duration	Start	Finish	Qtr 1, 2000			Qtr 2, 2000			Qtr 3, 2000			Qtr 4, 2000			Qtr 1, 2001				
						Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Voorbereiding Dijkvakken		279d	28-01-00	21-02-01																	
2	Opzetten varianten	MARTIJN	20w	28-01-00	15-06-00																	
3	Notitie keuze variant (voorontwerpdokument) bespreken WS + advies	MARTIJN	4w	16-06-00	13-07-00																	
4	Keuze variant bespreken PBZ	PBZ	1w	14-07-00	20-07-00																	
5	Uitwerken gekozen variant	MARTIJN	2w	5-07-00	18-07-00																	
6	Opstellen ontwerpnota	KEES	2w	4-09-00	15-09-00																	
7	Beoordelen nota Projectbureau	PBZ	1w	18-09-00	22-09-00																	
8	Opsturen ontwerpnota naar Toetsgroep	YVO	1d	4-10-00	4-10-00																	
9	Beoordelen nota Toetsgroep (schriftelijk!!)	YVO	14d	5-10-00	24-10-00																	
10	Opstellen ontwerpplan	JAN-WILLEM	2w	18-09-00	29-09-00																	
11	Opsturen ontwerpplan naar Dagelijks Bestuur WS	JAN-WILLEM	1d	4-10-00	4-10-00																	
12	Opsturen ontwerpnota- en plan naar A.O.	JAN-WILLEM	1d	4-10-00	4-10-00																	
13	Beoordelen ontwerpnota + plan door A.O. (schriftelijk!!)	JAN-WILLEM	14d	5-10-00	24-10-00																	
14	WWK-procedure	JAN-WILLEM	85d	25-10-00	20-02-01																	
15	Vaststellen ontwerpplan door DB (incl. evt. mondelinge toelichting)		1d	25-10-00	25-10-00																	
16	Publicatie ter inzage-legging		1d	26-10-00	26-10-00																	
17	Inspraakprocedure Waterschap, ter visielegging		4w	27-10-00	23-11-00																	
18	Hoorzitting (eventueel)		1d	8-12-00	8-12-00																	
19	Verwerken reacties (Waterschap + projectbureau)		10d	11-12-00	22-12-00																	
20	Vaststellen ontwerpplan door Waterschap		15d	25-12-00	12-01-01																	
21	Goedkeuringsprocedure GS (max. 12 weken)		4w	15-01-01	9-02-01																	
22	Melding goedkeuring aan DB Waterschap		1d	12-02-01	12-02-01																	
23	Publicatie goedkeuringsbesluit door Waterschap		1d	20-02-01	20-02-01																	
24	Opstellen bestek + tekeningen (concept)	LEO	9w	2-10-00	1-12-00																	
25	Opsturen bestek naar CX	LEO	1d	4-12-00	4-12-00																	
26	Bestek in behandeling bij CX + toetsgroep + intern PBZ	LEO	8w	5-12-00	29-01-01																	
27	Aanbesteding	LEO	1d	30-01-01	30-01-01																	
28	Gunning	LEO	1d	21-02-01	21-02-01																	

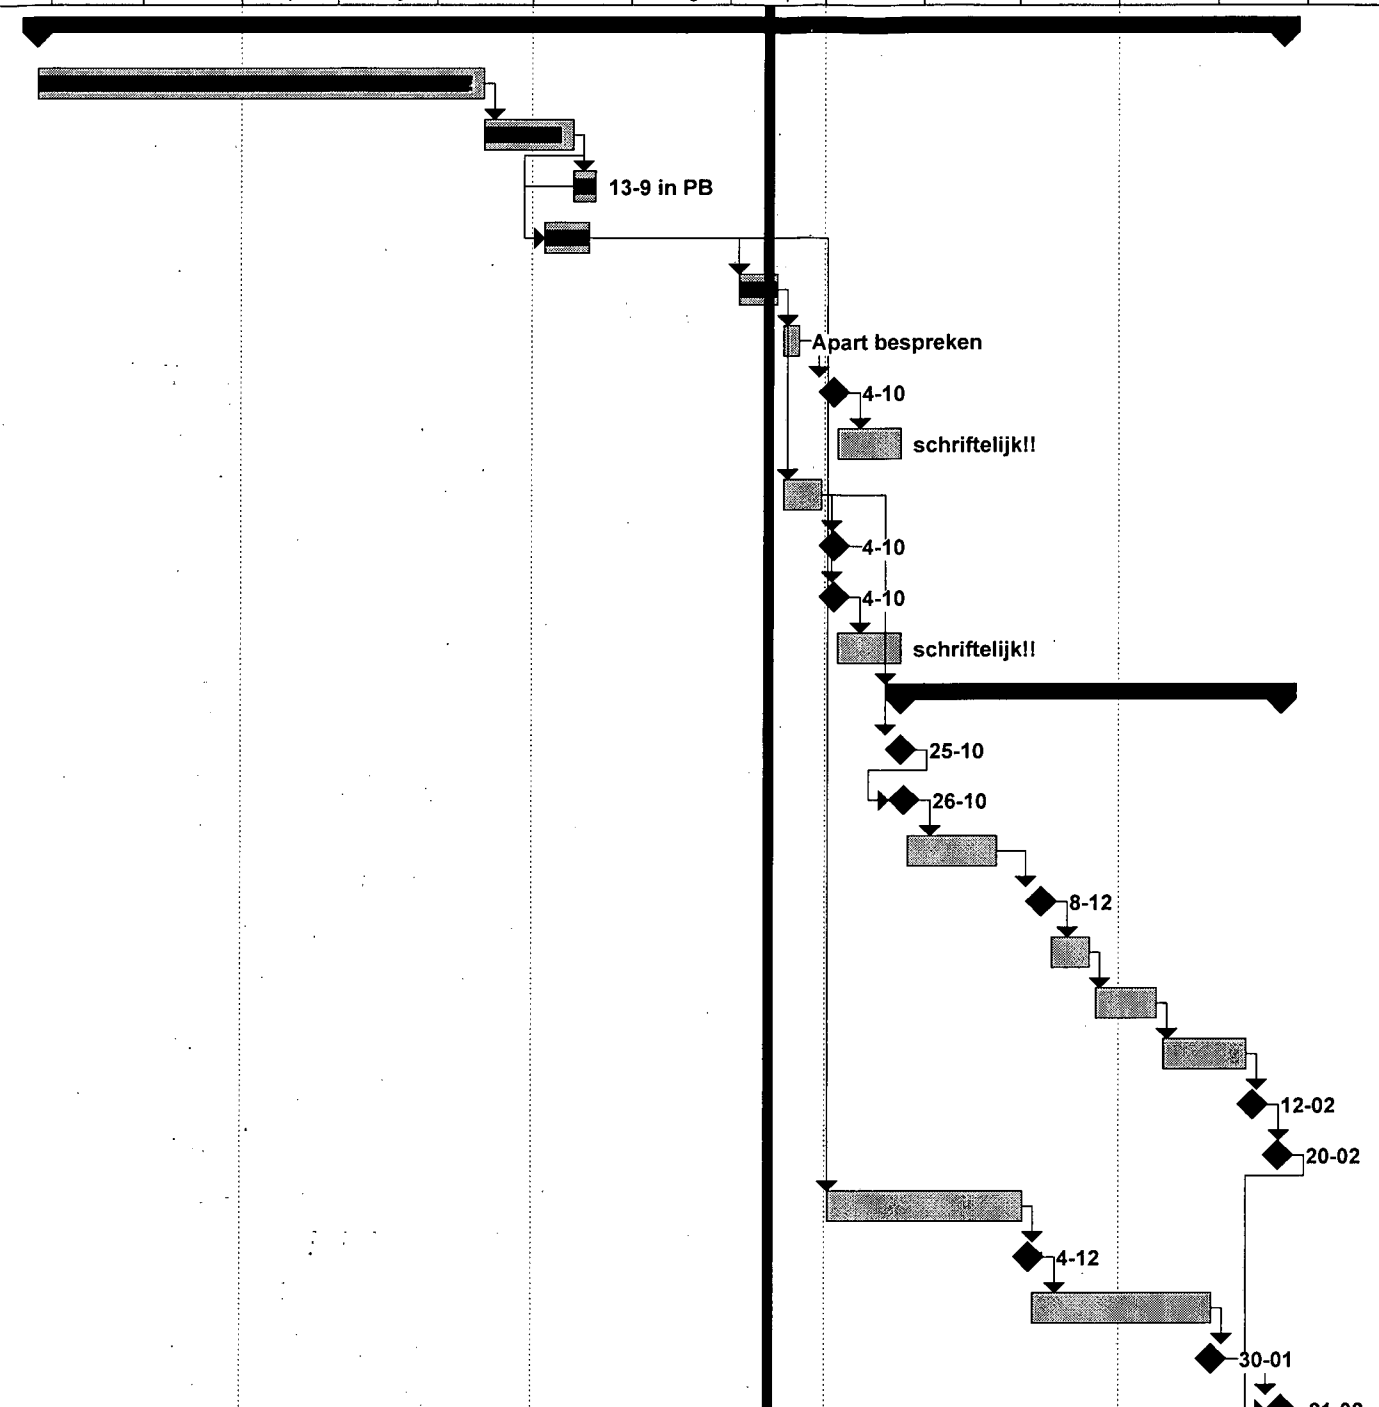

VOORBEREIDING

Detailplanning Waardepolder / Westveerpolder

Zeeuwse Eilanden

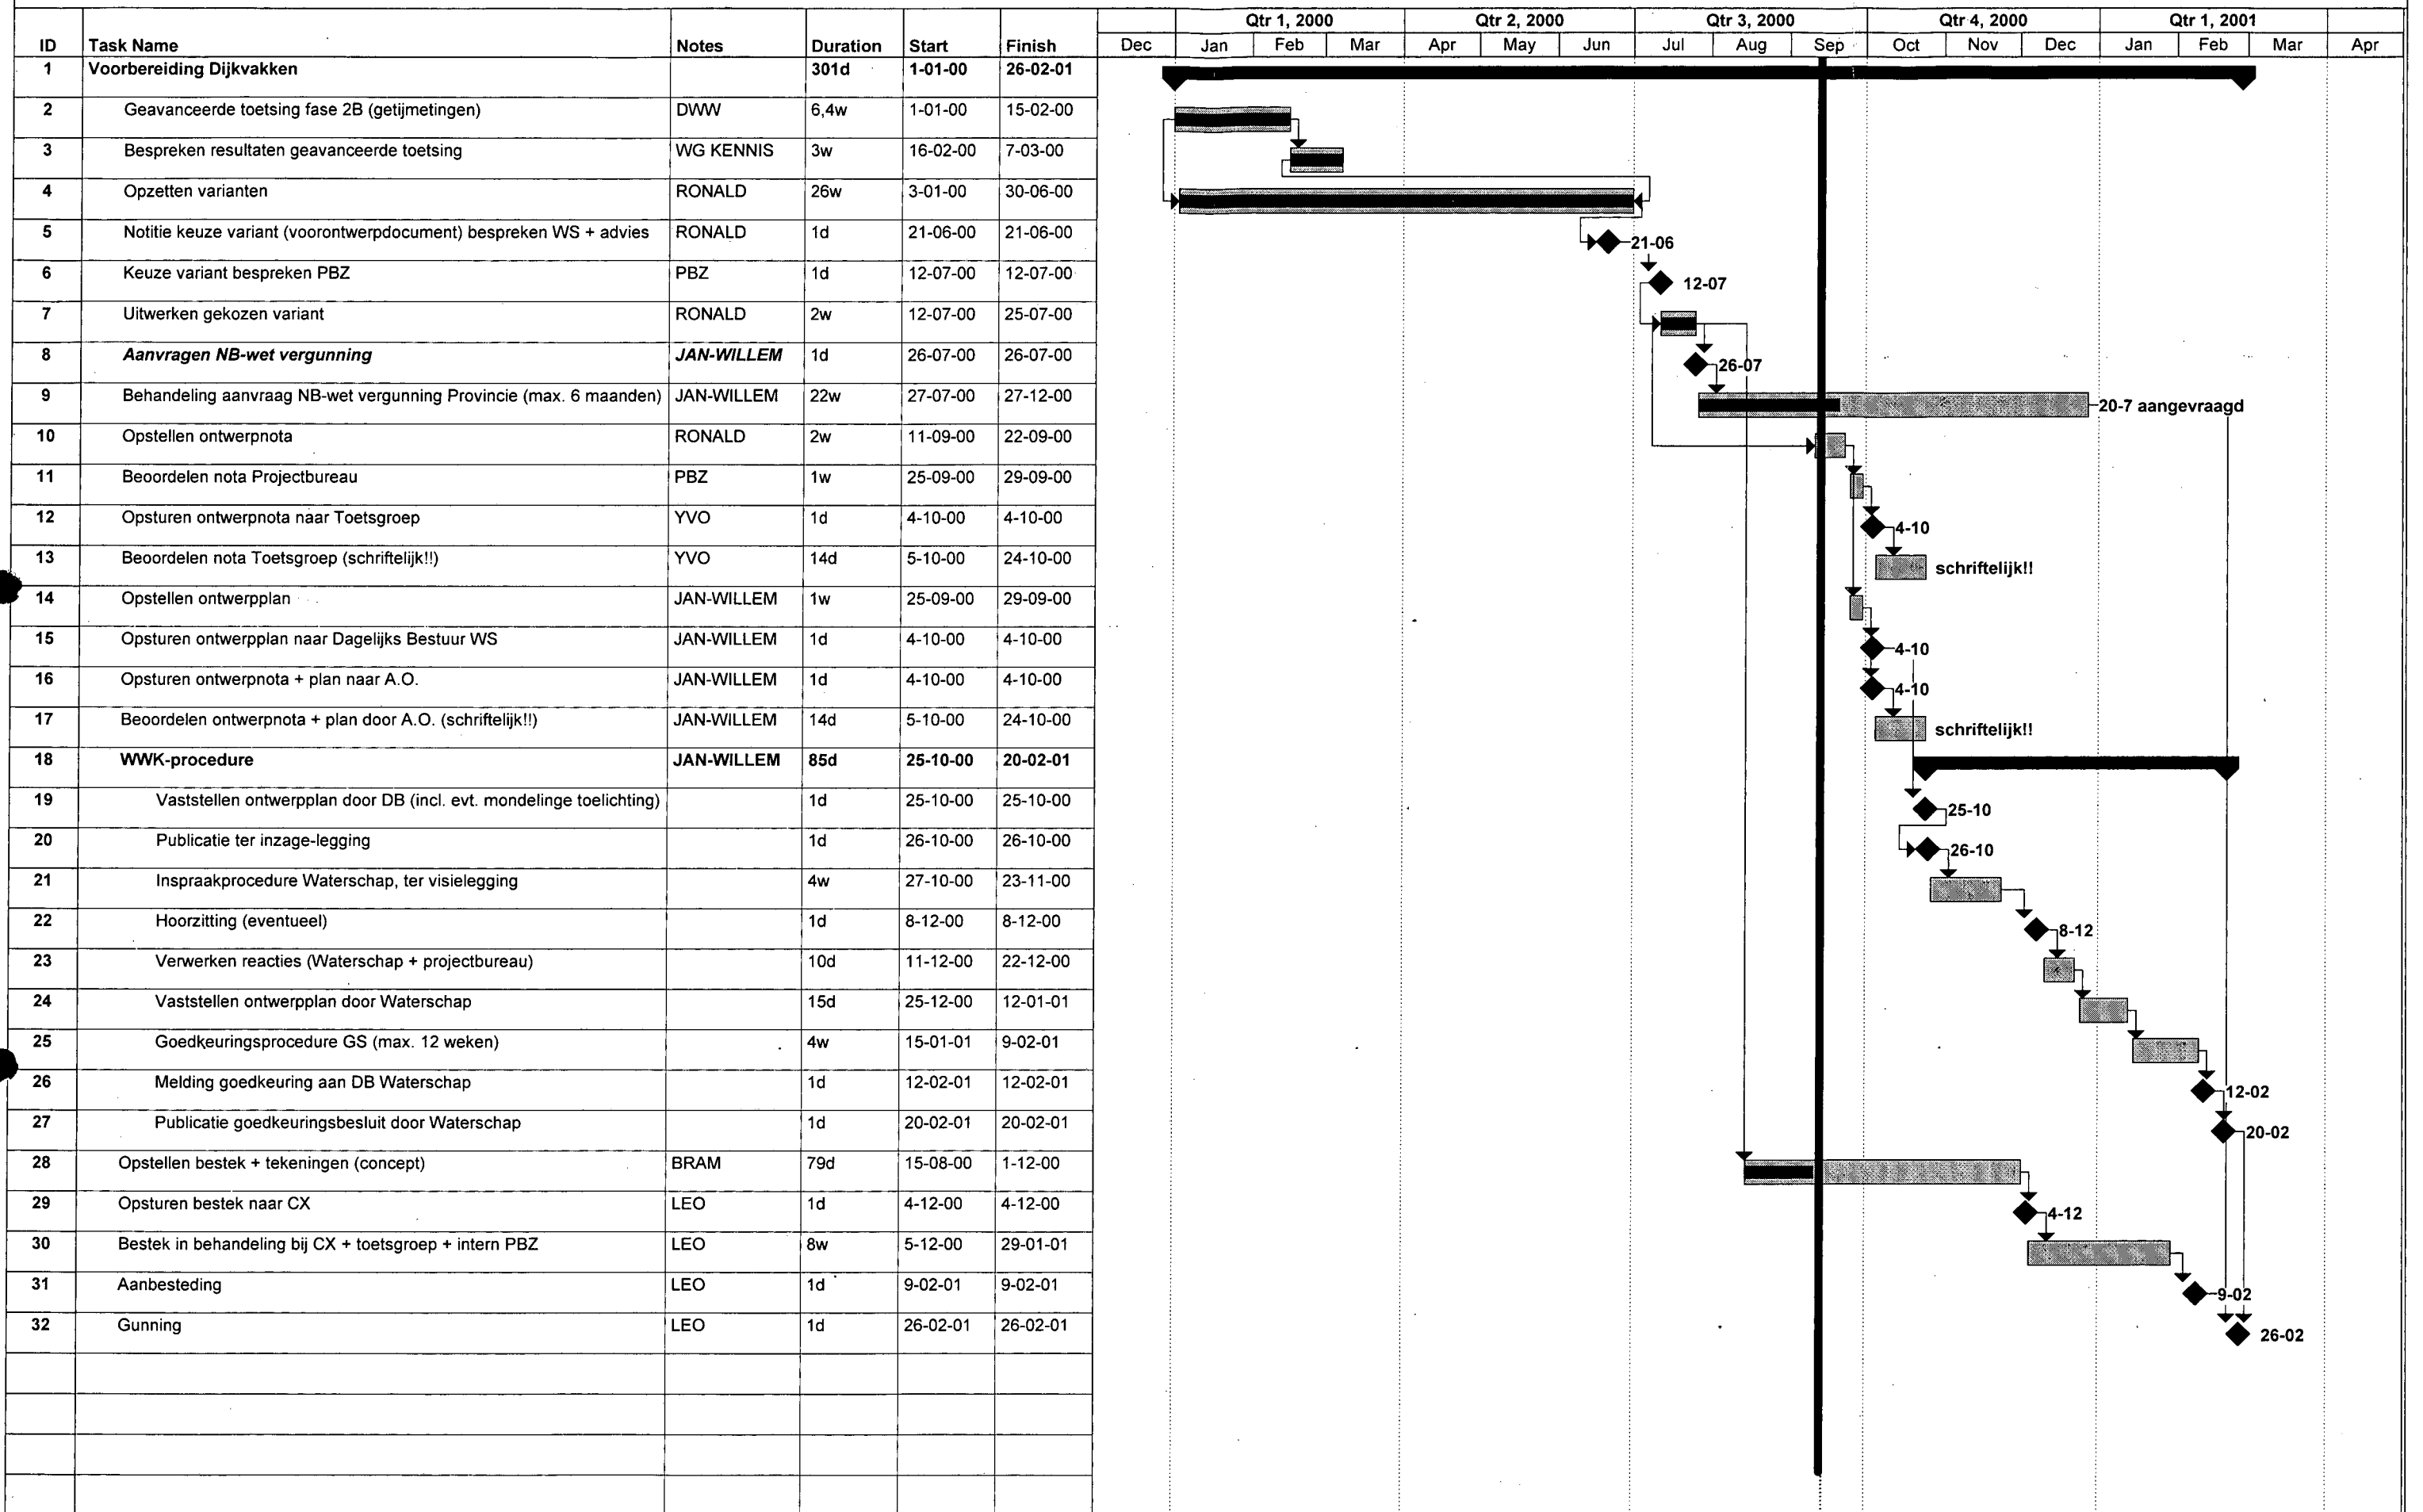

STATUS: HERZIEN 13-9-2000

Stand van zaken per: 13-9-00
