



Polder/bestek  
 Zimmermanpolder  
 dp 0083 – dp 0120  
 bestek ZL-4769

Aan  
 Simon Vereeke  
 Ad Beaufort  
 Raymond Derksen  
 Leden Pb

Toetsing uitgevoerd door  
 Roy van de Voort  
 Doorkiesnummer  
 (0118) 62 13 69  
 (06) 218 41 099

Datum  
 26 juni 2007  
 Bijlagen  
 1. Gloopingskaart met eindscores beheerder  
 2. Rapportage toetsing bekleding van  
 Waterschap Zeeuwse Eilanden (PZDT-M-  
 07336 rev)

Status  
 DEFINITIEF

Kenmerk  
 PZDT-M-07323 rev

### Beschrijving

Dit rapport beschrijft de revisietoetsing van de nieuw aangebrachte steenbekleding langs de Zimmermanpolder. Dit werk is uitgevoerd in 1999 waarbij de oude bekleding is vervangen door betonzuilen en op zijn kant gezette betonblokken. Het traject is gelegen op Zuid-Beveland aan de Westerschelde tussen de dijkpalen 0083 en 0120. De toetsing is uitgevoerd naar aanleiding van de revisie, uitgevoerd door het Waterschap Zeeuwse Eilanden. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het programma SteenToets versie 4.05.

Een luchtfoto van het traject is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: Luchtfoto Zimmermanpolder dp 0083 – dp 0120 (bron: [www.maps.google.nl](http://www.maps.google.nl))



012073 2007 PZDT-M-07323 rev  
Revisietoetsing Zimmermanpolder



### **Randvoorwaarden**

De gebruikte randvoorwaarden staan weergegeven in de ontwerpnota versie 3 van de Zimmermanpolder (PZDT-R-98462 ontw). De revisietoetsing is uitgevoerd met het ontwerppeil 2060.

### **Veldbezoek**

Op maandag 18 juni 2007 is een veldbezoek uitgevoerd door R. Derksen van Waterschap Zeeuwse Eilanden en R. van de Voort van het Projectbureau Zeeweringen. Er is één bijzonderheid geconstateerd, in de overgangsconstructie bij dp 0112, verwoord in de memo toegevoegd aan bijlage 2. Uitvoering van de maatregelen uit de memo zijn afdoende om dit probleem op te lossen. De aansluitingen op de groene dijk van de Emaelpolder en op de nieuwe dijkbekleding van de Reigersbergsche Polder zijn goed uitgevoerd.

### **Controle toetsing**

De toetsing van Waterschap Zeeuwse Eilanden, zoals beschreven in "Rapportage toetsing bekleding, Zimmermanpolder (Zuid-Beveland), dijkpaal 83-120" (PZDT-R-07336 rev) is gecontroleerd en in orde bevonden. Dit rapport vormt de basis van de in dit document beschreven toetsing. Alle voor de overdracht relevante stukken zijn op het projectbureau aanwezig.

### **Conclusie**

De nieuw aangebrachte bekleding van de Zimmermanpolder (bestek ZL-4769) is volledig goed getoetst. Hiermee is het traject gereed voor overdracht aan de beheerder.


Akkoord Projectbureau Zeeweringen,

projectleider Techniek

Akkoord waterschap Zeeuwse Eilanden,

directeur Waterkeringen en Wegen  
.....5-9-..... 2007

BIJLAGE 1: GLOOIINGSKAART MET EINDSCORES BEHEERDER

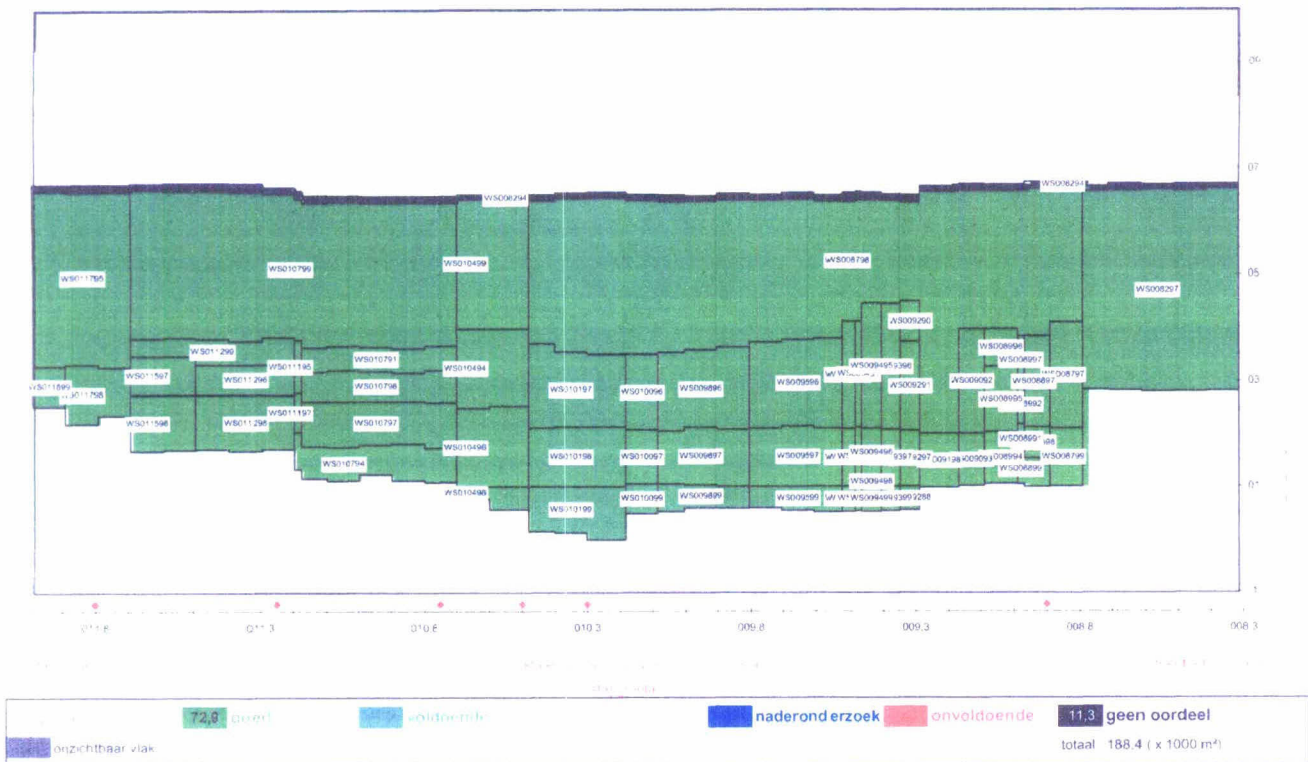



**BILAGE 2: RAPPORTAGE TOETSING BEKLEDING VAN WATERSCHAP ZEEUWSE  
EILANDEN (PZDT-M-07336 rev)**
