



003100 1998 ZHID-M-98020

ZEEWERINGEN BRIEF: SCOPE EN KADER VER



Aan

DWW (HID)
Postbus 5044
2600 GA Delft

RIKZ (HID)
Postbus 20907
2500 EX Den Haag

Bouwdienst (HID)
Postbus 20.000
3502 LA Utrecht

Directie Zeeland (HID)
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Contactpersoon
A. Hoekstra

Doorkiesnummer
0118- 686 410

Datum
12 februari 1998

Bijlage(n)
2 (figuur 1 en 2)

Ons kenmerk

Uw kenmerk

Onderwerp

Scope en kader versterking zeeweringen (m.n. Zeeland)

A. Opdracht

Na discussie in de Tweede Kamer over de consequenties van nieuwe inzichten in de sterkte van gezette steenbekledingen op de primaire waterkeringen in Nederland in oktober 1996 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat een driedelige opdracht verstrekt:

1. het in kaart brengen van de totale omvang van de problematiek van de gezette steenbekleding;
2. het i.s.m. de beheerders opstellen van een plan voor uitvoering van de verbetering van deze werken (prioritering en werkwijze) en het in 1997 en de jaren daaropvolgend in uitvoering nemen van de meest urgente dijkvakken in Zeeland;
3. het ontwerpen van een financiële regeling.

B. Organisatie uitvoering Zeeweringen landelijk

Deze opdracht aan de DG-RWS heeft geleid tot een uitvoerende organisatie zoals is weergegeven in figuur 1. De HID DWW is daarbij als opdrachtnemer verantwoordelijk voor ad. 1 als bovengenoemd. De HID van Zeeland voor het deel van ad. 2 als hier voorgenoemd dat in Zeeland speelt. De directies Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Nederland en IJsselmeergebied t.z.t. het in hun directie spelende probleem. Ad. 3 als hiervoor genoemd, wordt door HKA getrokken.

C. Organisatie uitvoering Zeeweringen Zeeland

De bij de realisatie van het produkt Zeeland betrokken partijen intern- en extern RWS zijn weergegeven in figuur 2.

Tevens zijn daarbij benoemd de documenten waarin de afspraken met betrokkenen over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en hun rol in het realisatieproces zijn/dienen te worden

Projectbureau Zeeweringen

Telefoon 0113 - 24 13 70

Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes

Telefax 0113 - 21 61 24

Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77, 4461 GL Goes

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd in samenwerking met de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland

vastgelegd.

In het volgende wordt nader ingegaan op de inhoud van deze documenten.

D. Inhoudelijk

1. Opdracht (Minister V&W aan DG-RWS) verbetering Zeeweringen landelijk

- 1.1 Zie blz. 1.
- 1.2 Bestuursovereenkomst landelijke financiering Zeeweringen.
 - In deze overeenkomst wordt vastgelegd de financiële regeling tussen Rijk en Unie van Waterschappen inzake de kosten van de landelijke verbetering Zeeweringen (Bijdrageregeling). Door RWS wordt gestreefd om deze overeenkomst in 1998 te sluiten.

2. Opdracht verbetering zeeweringen Zeeland.

- 2.1. Contractpartijen: Jaarcontracten tussen DG-RWS en HID-Zeeland.
- 2.2. Omschrijving van de opdracht met duidelijke demarcatie
 - Verbetering van steenbekledingen boventafel met status 'onvoldoende' naar 'goed' incl. steenbekledingen onderafel van dezelfde dijkvakken indien bij nadere toetsing door PZ blijkt dat deze status 'onvoldoende' bezitten.
De desbetreffende dijkvakken zijn opgenomen in de overzichtsstaat, bijlage 2 van het projectplan.
- 2.3. Opleverdatum produkt Zeeland
 - Verbetering steenbekledingen van de dijkvakken genoemd in bijlage 2 van het projectplan, voltooid per 01-10-2004.
- 2.4. Budget produkt Zeeland
 - Voor het produkt Zeeland is een projectbudget benodigd van ad. Mfl. 415* ± 30% (incl. engineering, diversen, object onvoorzien, BTW en excl. IBO-RWS personeel). De voorgestelde meerjarenreeks daarbij luidt:

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
40	50	60	60	60	60	60	25

* Afgeleid uit van de financiële onderbouwing van brief van de Minister aan de Tweede Kamer.

- 2.5. Bevoegdheid
 - HID-Zeeland heeft de verantwoordelijkheid en bevoegdheid om de te volgen werkwijze voor realisatie product Zeeland en de organisatie daarvan vast te stellen.

3. Samenwerkingsprotocollen zeeweringen Zeeland.

- 3.1. Jaarlijks protocol van samenwerking tussen HID-Zeeland en HID's DWW, RIKZ en BD.
- 3.2. Omschrijving van de opdracht met duidelijke demarcatie
 - HID-DWW:
 - aanleveren van toetsmethodieken/toetsregels per type glooiing constructie uiterlijk per 01-03-1998
 - aanleveren van ontwerpregels voor glooiingconstructies
 - opstellen van onderzoeksprogramma's in het kader van het project, begeleiding van dit onderzoek en vertaling van de onderzoeksresultaten in toets- en ontwerpregels
 - participatie in de ontwerpteams en toetsteams tot einde project.
 - HID-RIKZ:
 - aanleveren van te hanteren hydraulische randvoorwaarden Westerschelde uiterlijk per 01-02-1998
 - idem Oosterschelde uiterlijk per 01-07-1998.
 - HID-BD:

- participeren in ontwerpteams tot einde project.
- ondersteuning bij opzetten en implementatie van methodieken en systemen t.b.v. de projectbeheersing (planning, kostenbeheersing, risico-analyse, kwaliteitsborging).

3.3. Opleverdatum.

- De samenwerkingsprotocollen Zeeweringen Zeeland worden jaarlijks aangegaan gedurende de looptijd van het project, voorlopig tot 01-10-2004. Na afronding van de thans in uitvoering genomen landelijke inventarisatie 2001 zal de looptijd van het project Zeeland nader worden vastgesteld

3.4. Gereserveerd budget t.b.v. de samenwerkingsprotocollen.

- Jaarlijks zullen per dienst protocollen, afgeleid van de jaarplannen PZ, worden opgesteld (en ondertekend) waarin de activiteiten, personele inzet en financiële middelen worden vastgesteld.

3.5. Verantwoordelijkheden.

- De participerende directies/diensten zijn verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en geschiktheid van voor het project Zeeland in te zetten personeel en voor de tijdige en correcte uitvoering van de in het protocol overeengekomen werkzaamheden.

4. Projectplan en bestuurlijke omgeving Zeeweringen Zeeland

4.1. Het projectplan Zeeweringen Zeeland is het opdrachtdocument tussen de I.-H.I.D.-Zeeland (hoofd AX) en de projectmanager PZ. In het projectplan zijn de opdrachtformulering, de gehanteerde uitgangspunten, het projectbudget, de datum van oplevering project en de werkwijze omschreven.

Bij het opstellen van het projectplan ten behoeve van de uitvoering van het produkt Zeeland is er van uit gegaan dat een duidelijke afbakening en helderheid is/wordt geboden.

4.2. Bestuursovereenkomst voorfinanciering 1997 Zeeweringen Zeeland.

In deze overeenkomst is opgenomen de verrekening conform de financiële regeling in document I,2 van de door RWS in 1997 gedane voorfinanciering betreffende gerealiseerde werken Zeeweringen Zeeland. Deze overeenkomst wordt in 1997 gesloten, vooruitlopend op de uitkomst van de besprekingen over de financiële regeling.


4.3. Beheersovereenkomst Zeeweringen Zeeland.

In deze overeenkomst is voor de jaren t/m 2004 de personele en materiële inbreng van de waterschappen in het project Zeeweringen Zeeland opgenomen alsmede de verrekening van daarmee gemoeide kosten.

5. Overige (ad hoc) overeenkomsten

Figuur 1

Uitvoerende organisatie verbetering zeeweringen landelijk

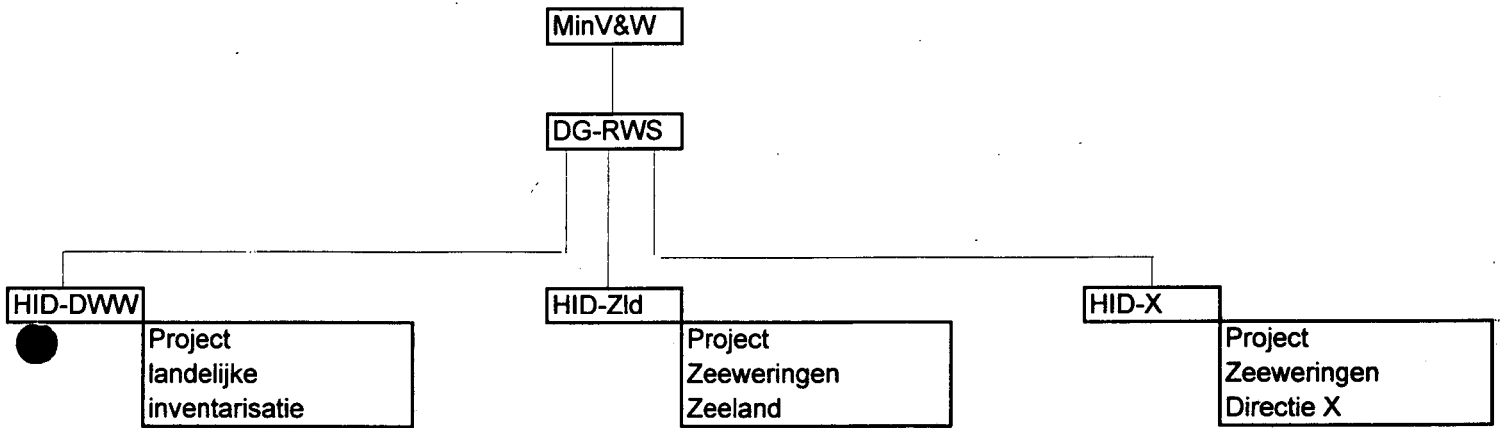

Figuur 2

Bij project Zeeweringen Zeeland betrokken partijen

